

# ALLEGATO "A"

**Comune di Serracapriola**  
Provincia di Foggia

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI PAOLO II" IN CORSO GARIBALDI.

**COMMITTENTE:** Comune di Serracapriola

**CANTIERE:** via Cavour e via Salvator Rosa, Serracapriola (Foggia)

Serracapriola, 02/10/2014

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

---

(Architetto Borrelli Clotilde)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

---

(Sindaco Pro-Tempore Camporeale Marco)

### **Architetto Borrelli Clotilde**

viale Cavalier De Luca, 26  
71010 Serracapriola (Foggia)  
Tel.: 0882681079 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: arch.ttivalente\_borrelli@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo	1	E	6	8	02/03/2015	09/03/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	6	24/06/2015	29/06/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	7	9	05/03/2015	13/03/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	4	13/03/2015	16/03/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	16/03/2015	17/03/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	18/03/2015	19/03/2015
<b>RIPRISTINI</b>						
Rimozione di cls ammalorato	1	E	15	22	19/03/2015	09/04/2015
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	15	22	30/03/2015	20/04/2015
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	9	14	27/03/2015	09/04/2015
Rimozione di massetto	1	E	10	12	23/03/2015	03/04/2015
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1	E	11	15	19/03/2015	02/04/2015
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	7	11	10/04/2015	20/04/2015
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	15	21	10/04/2015	30/04/2015
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	12	16	13/04/2015	28/04/2015
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	12	16	13/04/2015	28/04/2015
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	8	10	04/05/2015	13/05/2015
<b>OPERE INTERNE - EDILI</b>						
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	4	6	14/05/2015	19/05/2015
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	6	8	20/05/2015	27/05/2015
Posa di pavimenti per interni	1	E	6	9	28/05/2015	05/06/2015
Realizzazione di murature interne	1	E	5	5	08/06/2015	12/06/2015
Cuci scuci	1	E	5	5	08/06/2015	12/06/2015
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento pavimentazione	1	E	3	6	29/05/2015	03/06/2015

## LEGENDA:

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA


*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	15 Marzo 2015																			
		28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	83 g	▼																			
Allestimento di cantiere temporaneo	6 g	Z1						6													
Smobilizzo del cantiere	4 g																				
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g	Z1					7														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g														Z1	2					
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g															Z1	2				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g																	Z1	2		
<b>RIPRISTINI</b>	38 g	▼																			
Rimozione di cls ammalorato	15 g																		Z1	15	
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	15 g																				
Rimozione di manto di copertura in tegole	9 g																				
Rimozione di massetto	10 g																				
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	11 g																		Z1	11	
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	7 g																				
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	15 g																				
Posa di manto di copertura in tegole	12 g																				
Realizzazione di opere di lattoneria	12 g																				
Impermeabilizzazione di coperture	8 g																				
<b>OPERE INTERNE - EDILI</b>	21 g																				
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g																				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g																				
Posa di pavimenti per interni	6 g																				
Realizzazione di murature interne	5 g																				
Cuci scuci	5 g																				
Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento pavim	3 g																				
<b>LEGENDA Zona:</b>																					
Z1 = ZONA UNICA																					

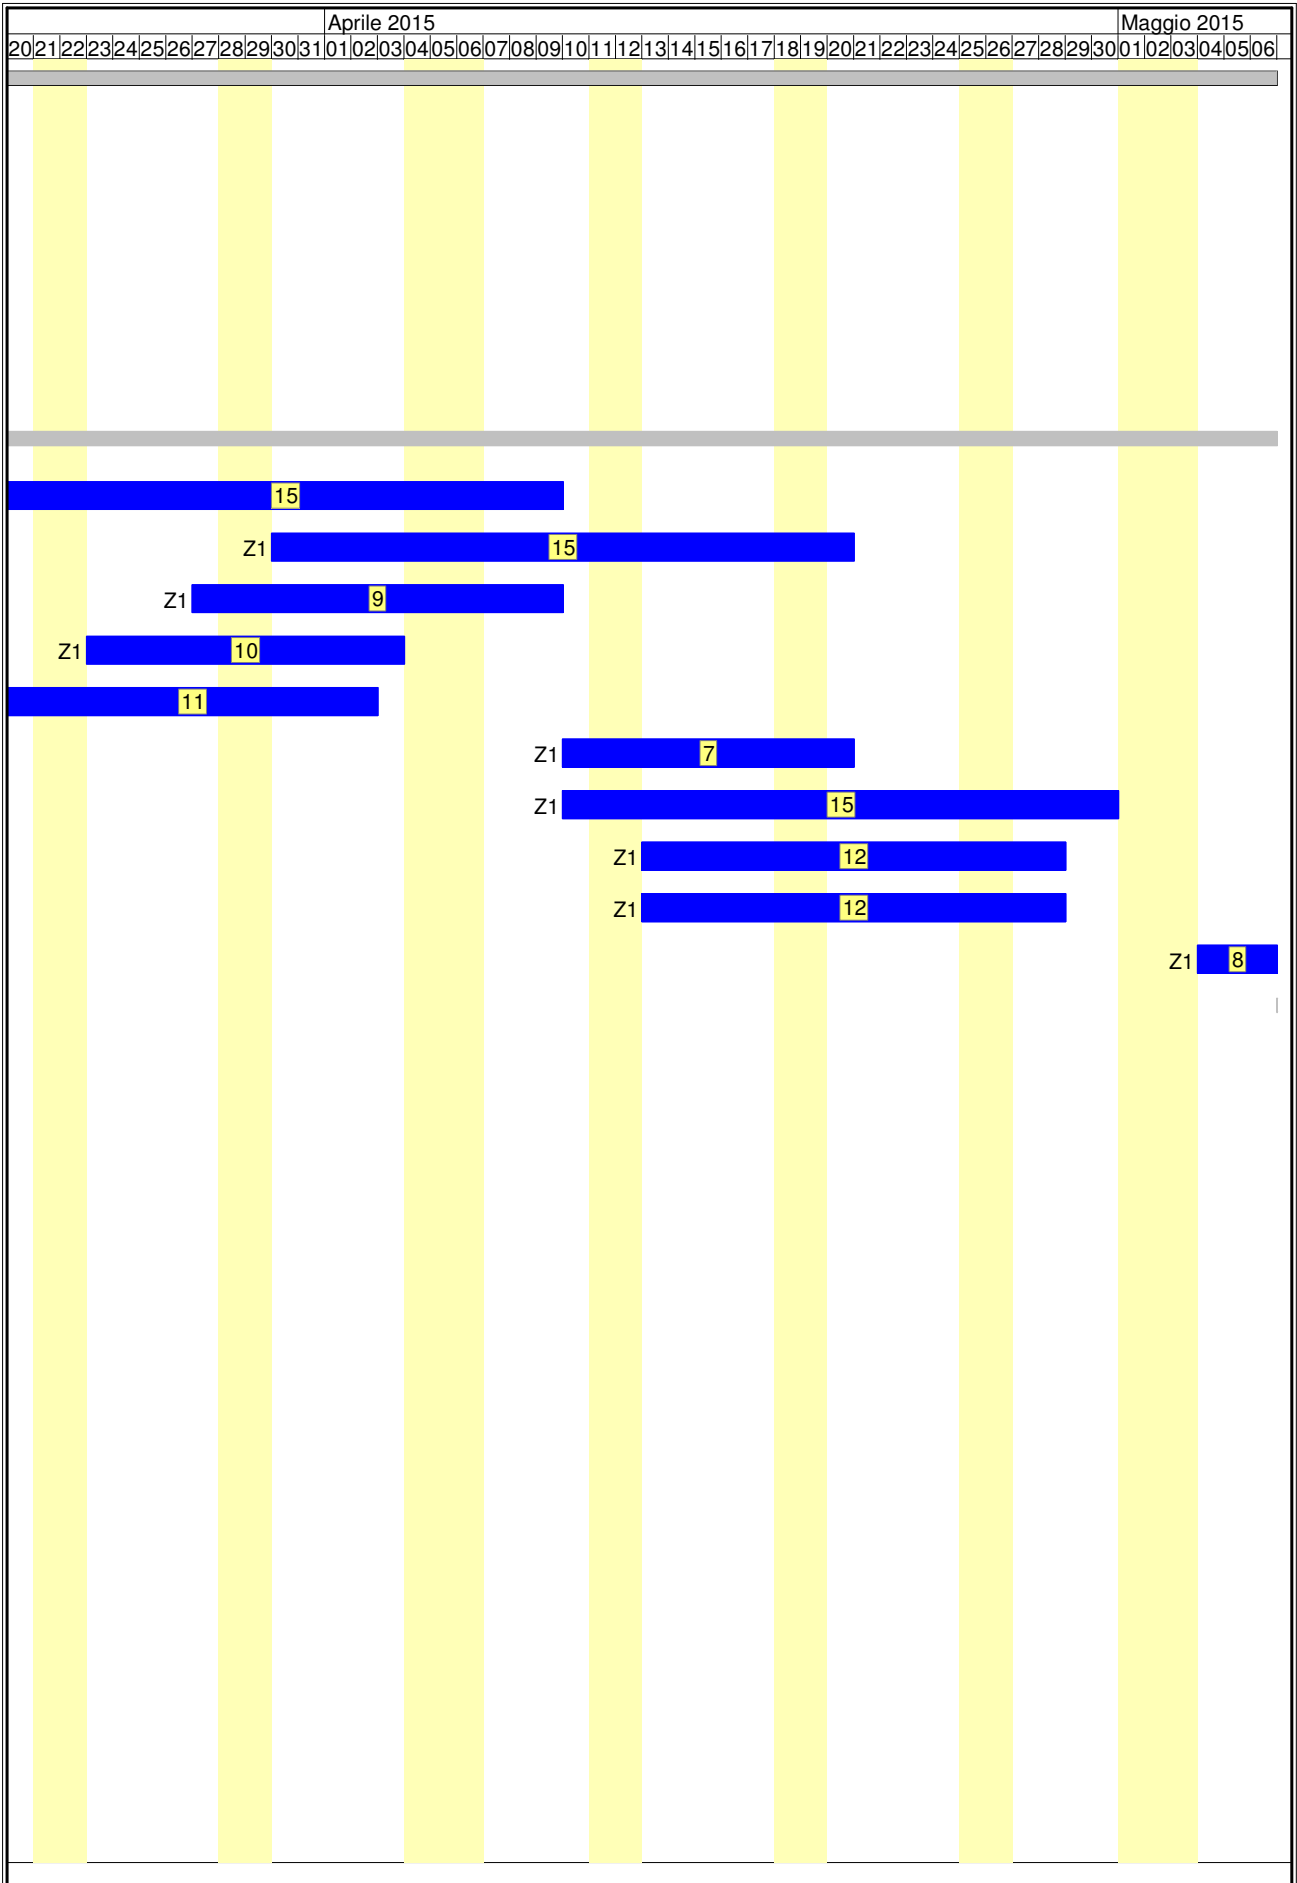

Z1



8



Z1 4

Z1 6

Z1 6

Z1 5

Z1 5

Z1 3

